

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

(inwentaryzacja)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Remont drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie od km 3+910 do km 4+893
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski dz. nr ew. 164 obręb nr 0002 Chełmca Duża dz. nr ew. 11 obręb nr 0012 Świątkowizna Gmina Fabianki Kategoria obiektu budowlanego - XXV
INWESTOR	Powiat Włocławski Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach
BRANŻA	P.S.O.R.

Projektant:	Nr uprawnień	Data	Podpis
mgr inż. Dariusz Olejnik	KUP/0144/PBD/21	24.10.2025	

SPIS ZAWARTOŚCI

1. OPIS TECHNICZNY

2. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu związany z remontem drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie od km 3+910 do km 4+893.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2022r. poz. 988 tekst jednolity).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 tekst jednolity);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310);
- Wizja lokalna w terenie

III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

W związku z planowanym remontem drogi powiatowej zaistniała konieczność inwentaryzacji stałej organizacji ruchu.

Droga powiatowa nr 2737C posiada jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, przekrój jedno-jezdniowy o dwóch pasach ruchu, o szerokości jezdni 5,0 m. Droga ta na odcinku od km 3+910,00 do km 4+534,00 wyposażona jest w jednostronny chodnik, zjazdy, pobocza oraz rowy otwarte.

IV. OZNAKOWANIE ISTNIEJĄCE

Na planowanej do remontu drodze znajduje się istniejące oznakowanie.

V. ORGANIZACJA DOCELOWA


W ramach opracowania nie wprowadzono dodatkowego oznakowania. Istniejące oznakowanie należy wymienić na nowe.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Istniejące oznakowanie pionowe do wymiany na nowe:

istn. A-6b	2szt
istn. A-7	2szt
istn. A-1	1szt
istn. A-3	1szt
istn. E-19	2szt
istn. A-2	1szt
istn. A-6c	2szt
istn. U-18a	1szt

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

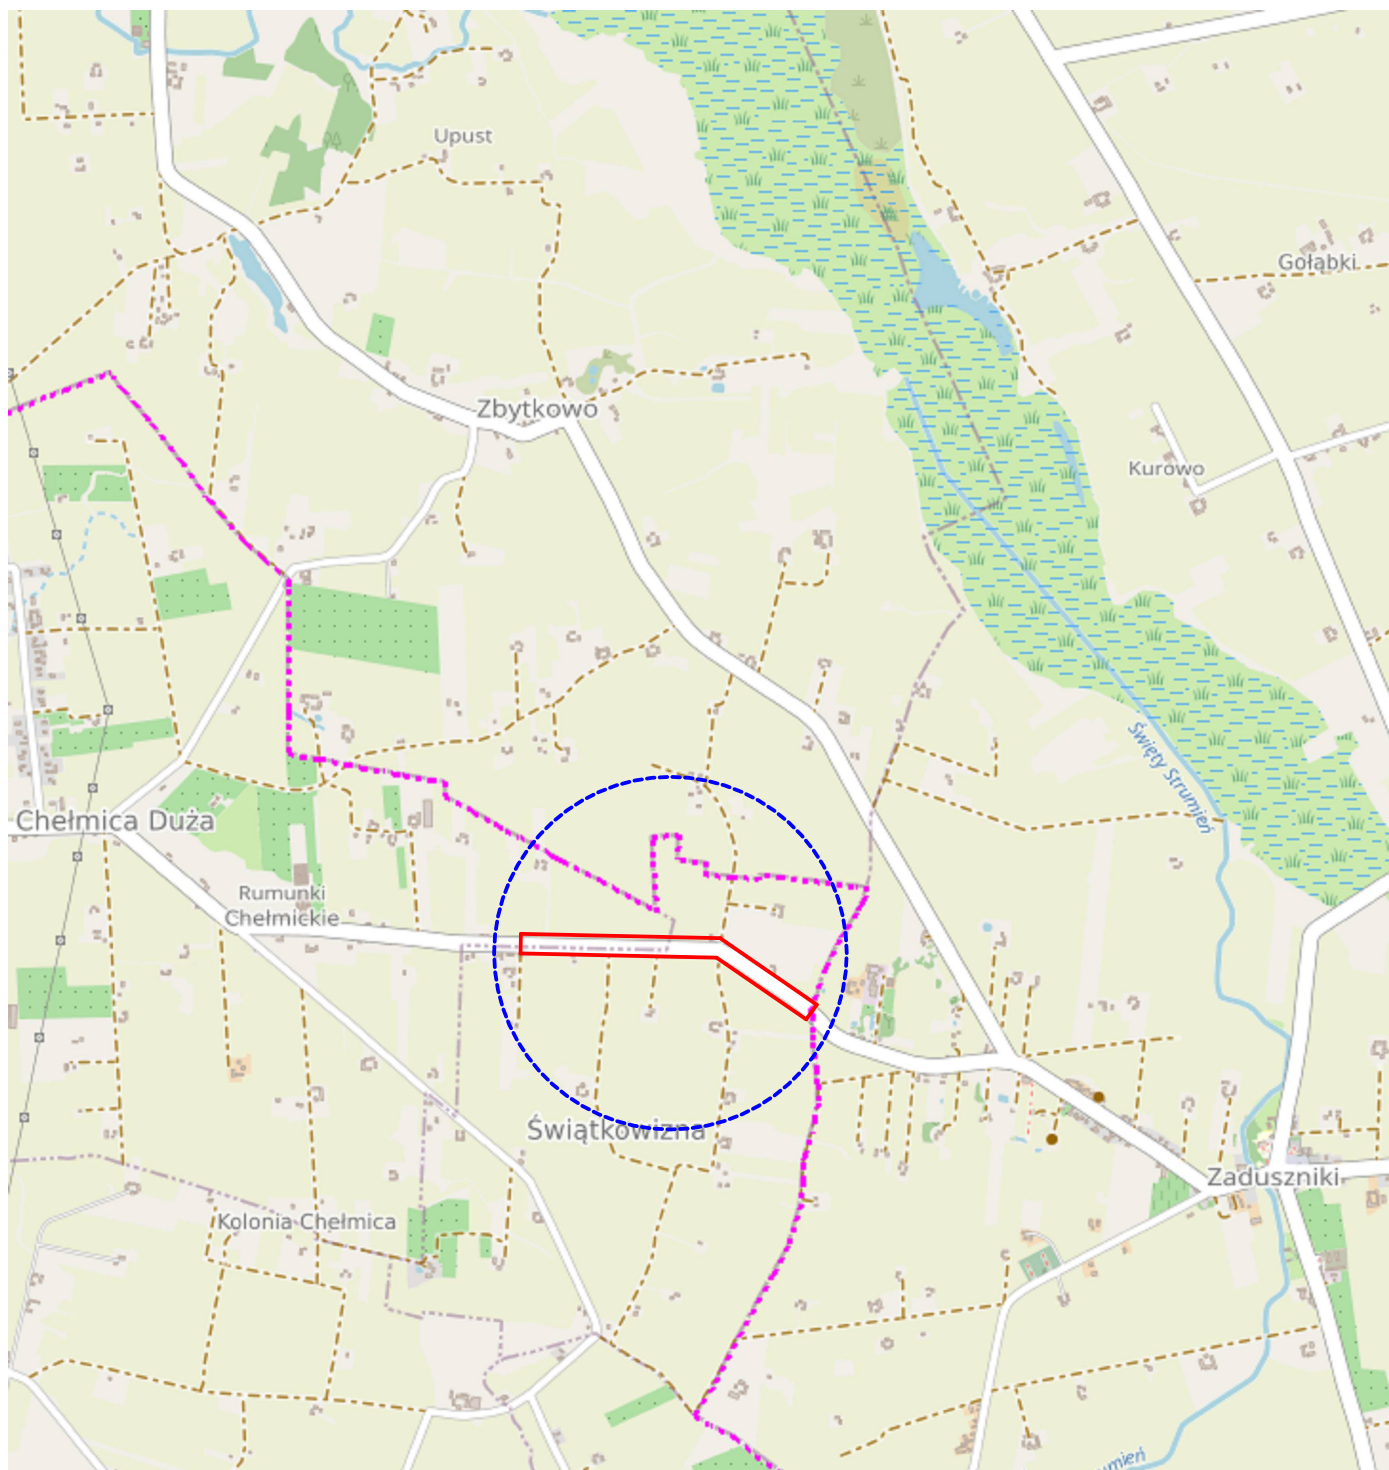

 zakres remontu

Jednostka projektowa:	DKM Dariusz Olejnik Kłóbka 5A 87-840 Lubień Kujański		
Inwestor:	Powiat Włocławski Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach		
Nazwa inwestycji:	Remont drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie od km 3+910 do km 4+893		
Przedmiot rysunku:	Plan orientacyjny	Faza: P.S.O.R.	
Projektant:	mgr inż. Dariusz Olejnik upr. proj. w spec. proj. drog. nr. KUP/0144/PBD/21		Podpis:
	Branża: Drogowa	Data: 24.10.2025r.	Nr rys. 1

